# 松本クリーンセンターにおける設備点検中に発生した作業事故について

2026年11月13日

（株）シーテック

中部電力グループ

# 事象概要

| | |
|---|---|
| 発生日時 | 2026年11月8日（日）　9時30分頃　　天候（晴） |
| 発生場所 | 松本クリーンセンター　可燃ごみ処理施設（長野県松本市大字島内７５７６番地１） |
| 事故状況 | ・ 8時40分　　停電操作・仮設電源切替完了<br>・ 8時45分　　点検作業開始<br>・ 9時20分~25分 設備の健全性を確認するために実施する絶縁抵抗測定※（送電線：1,2号線　線路断路器～遮断器間）の準備として、結線図により、操作対象となる接地装置の番号を確認<br>・ 9時31分　　1号線側の絶縁抵抗測定のために必要な接地装置の番号を誤認し送電線側を接地した【1号線送電線停止】<br>・ 9時31分　　2号線側の絶縁抵抗測定のために必要な接地装置の番号を誤認し送電線側を接地した【2号線送電線停止】<br>・ 9時40分　　中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ給電制御所から送電線停電発生の連絡を受け作業中断 |
| 作業名 | 松本クリーンセンター　可燃ごみ処理施設　電気設備点検 |
| 事故原因 | 接地操作を実施した際、本来操作すべき装置と異なる装置を誤って操作したため |
| 供給支障 | 中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞの営業回線を停止　安曇野市、松本市の最大32,160戸停電、JR大糸線の一部運休 |
| 施工 | 元請：カナデビア（株）様、一次下請（株）シーテック |


※ **絶縁抵抗測定：電気が漏れていないかを確認するために回路や機器の絶縁性能を評価する測定**


Copyright © C-TECH CORPORATION All rights reserved.


# 発生状況（１号線の場合）

**ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）　※**

（回路図）

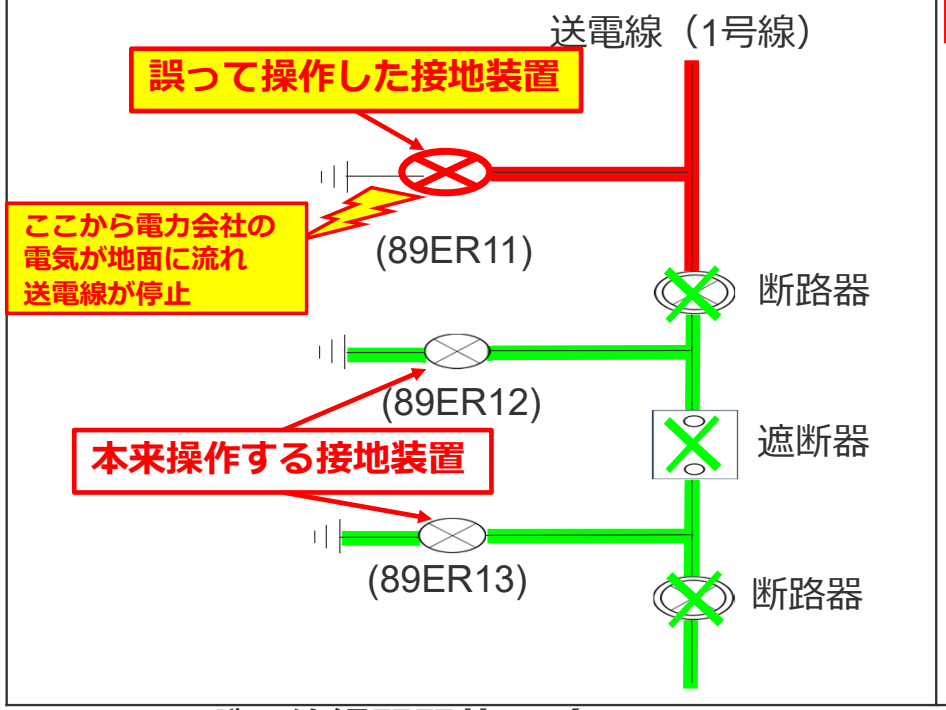


（操作箱配置図）

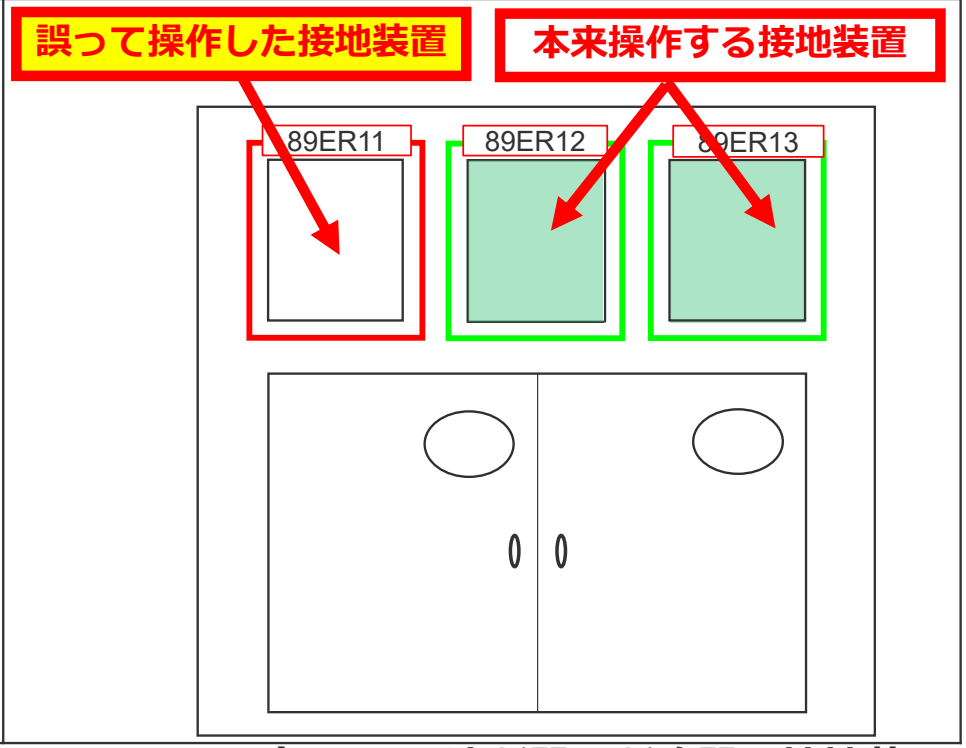



停止範囲

※　ガス絶縁開閉装置（GIS：Gas Insulated Switchgear）とは、遮断器・断路器・接地装置などを絶縁ガスで満たした金属容器内に収めた装置です。


Copyright © C-TECH CORPORATION All rights reserved.

# 松本クリーンセンター　構内配置図

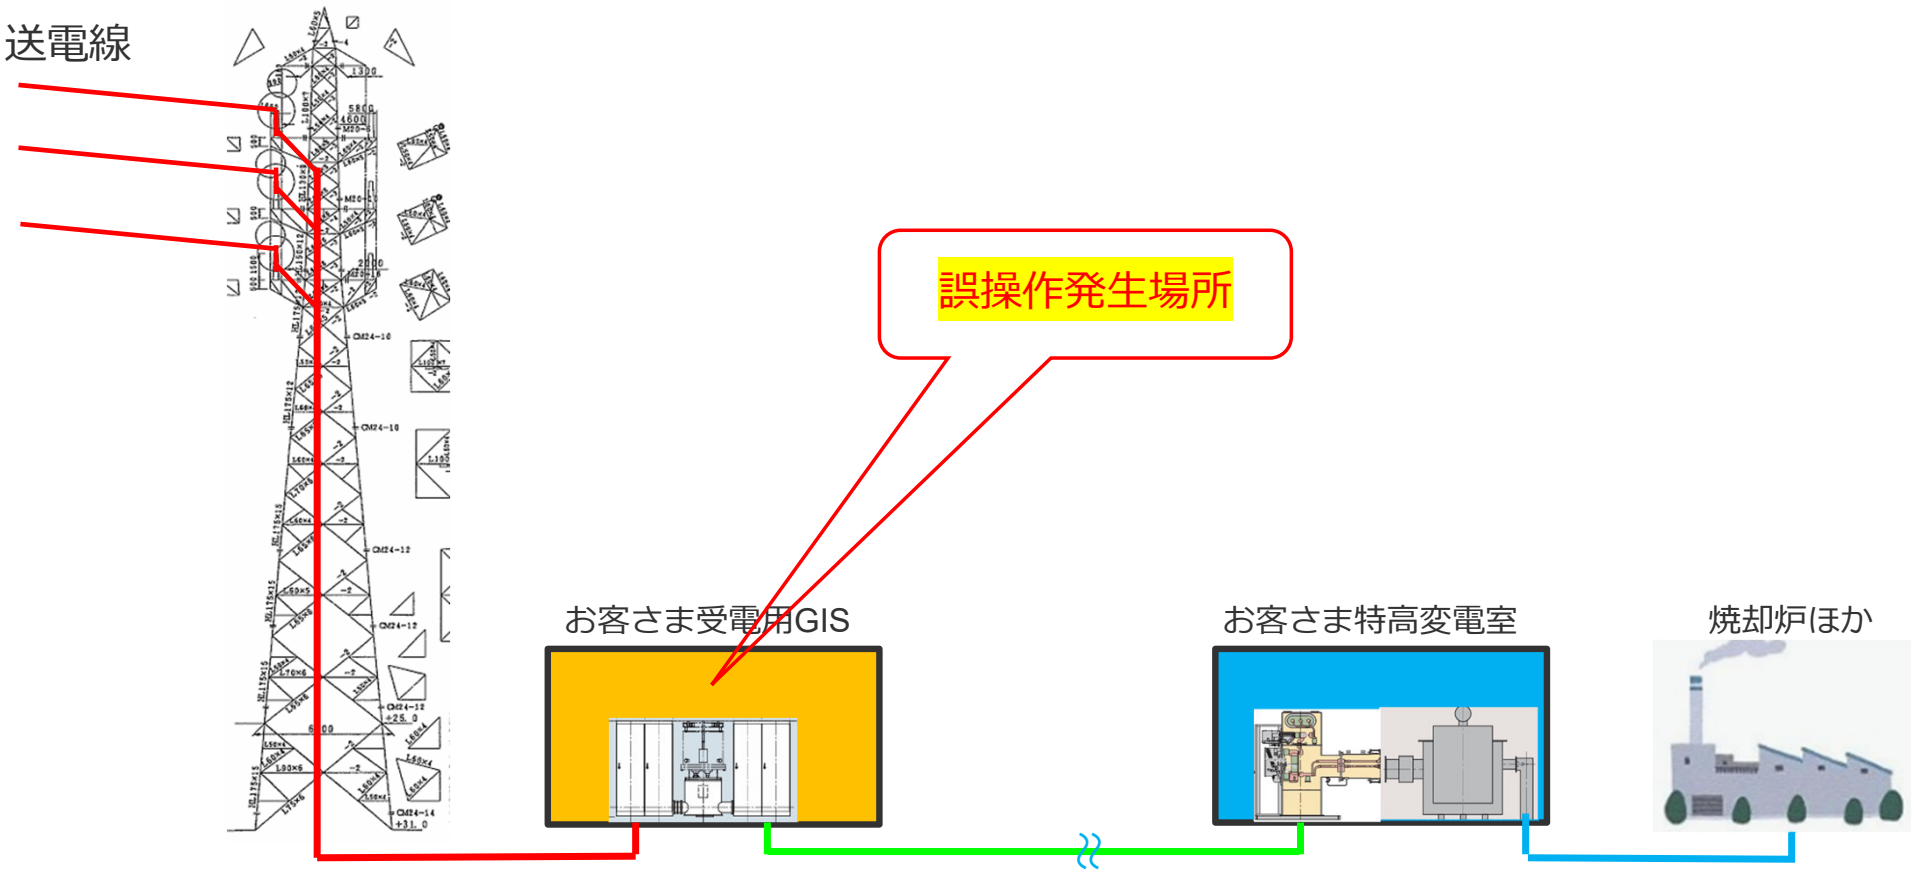




Copyright © C-TECH CORPORATION All rights reserved.

中部電力グループ




Copyright © C-TECH CORPORATION All rights reserved.
